

# NOTICE DE DEMONTAGE

28/02/24 STATION 2

Cette notice présente la chronologie de démontage de la station 1.  
Elle vaut notice de montage lorsqu'elle est reprise en sens inverse.  
Effectif à prévoir : 4 personnes  
Temps à prévoir : 3 semaines




ETAPE  
1

## REMARQUES

### Dépose bardage ajouré


Dépose du bardage ajouré et de la structure support  
Stockage des bois sur chantiers et rablettes  
entre chaque rang

IMAGE

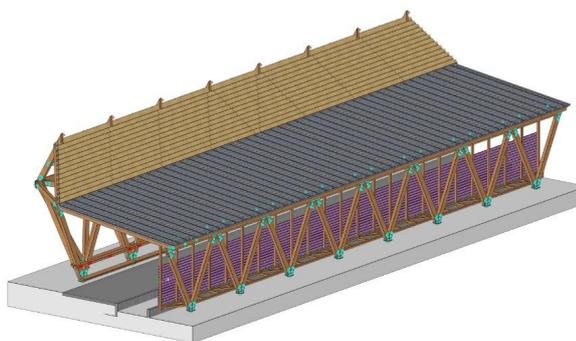


Dévisage des lames profil 65\*65 de  
bardage ajouré

Quantité : 135  
A 2 personnes

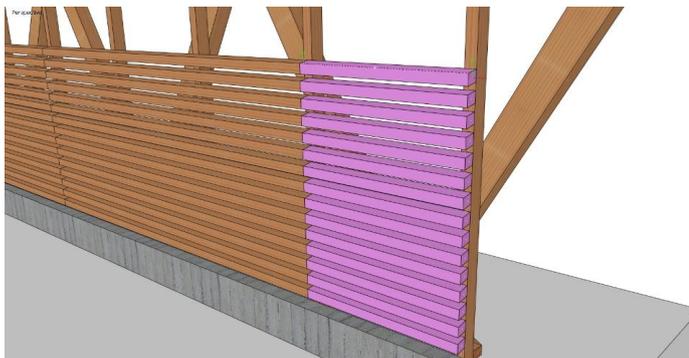

Dépose de la poutre auvent treillis en pied  
de bardage  
Vissée contre bipodes et derrière montants  
verticaux  
Démontage pièce par pièce

Quantité : 58  
A 2 personnes

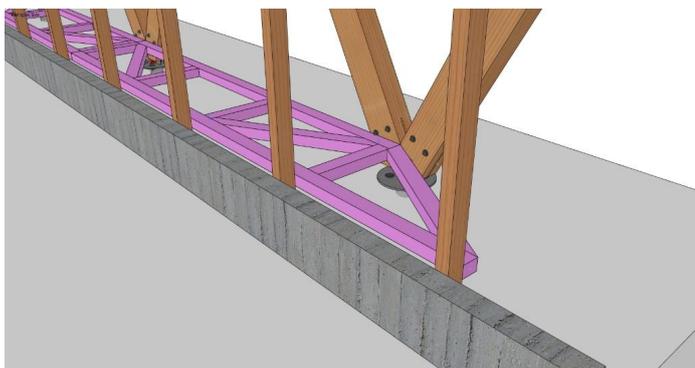

Dépose des montants verticaux supports de  
bardage ajouré  
Vissés en tête contre chevrons


Quantité : 24  
A 2 personnes



2


**Dépose assises et cales-pied**

Dépose des assises des cales pieds  
Stockage des bois sur chantiers

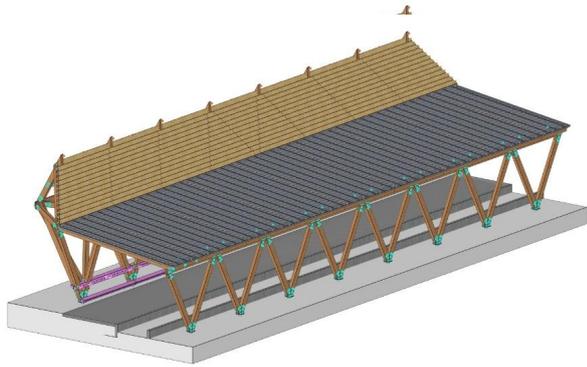


Dépose des assises moisées sur les tripodes  
Boulonnées sur tripodes verticaux et  
boulonnées entre elles

Quantité : 20  
A 2 personnes

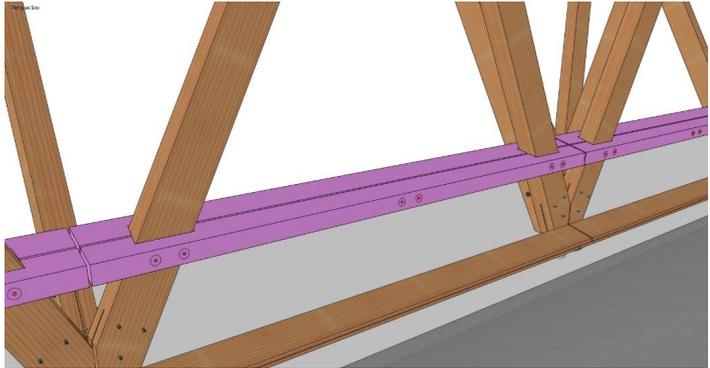

Dépose des cales pieds  
Vissés contre tripodes verticaux


Quantité : 10  
A 2 personnes

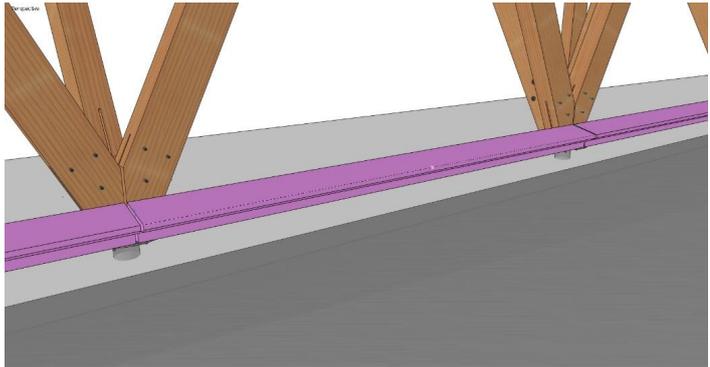

3

**Mise en place sécurité collective en toiture**


Pose de garde-corps en rives et bas de  
pente de toiture zinc à joint debout

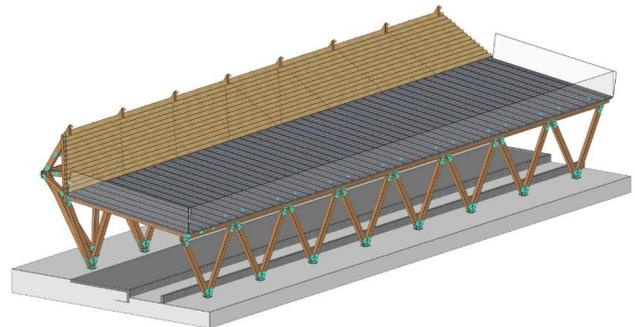

4

**Dépose bardage haut**


Dépose du bardage supérieur  
Stockage du bardage sur chantiers et  
rablètes pour ventilation des lames

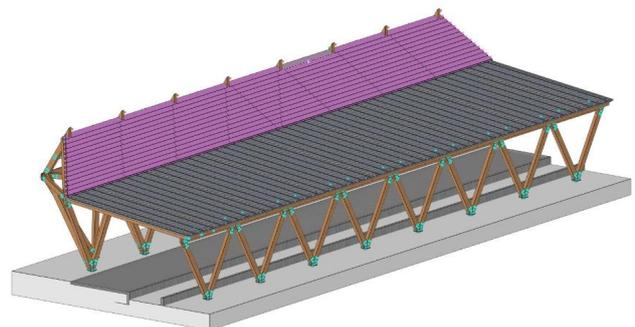

Dévisage des lames de bardage à chaque latte support

Quantité : 47m<sup>2</sup>  
A 2 personnes


Perspective

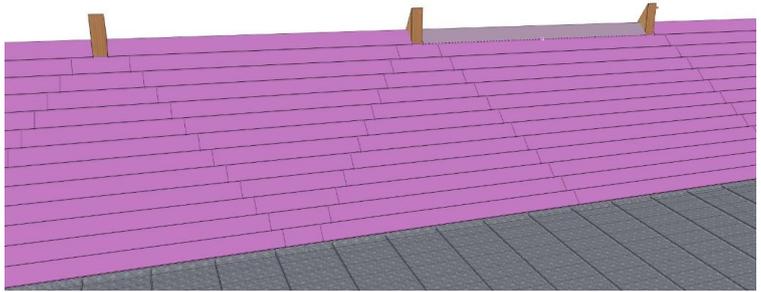

5

### Dépose couverture


Dépose de la couverture bacs à joints debouts

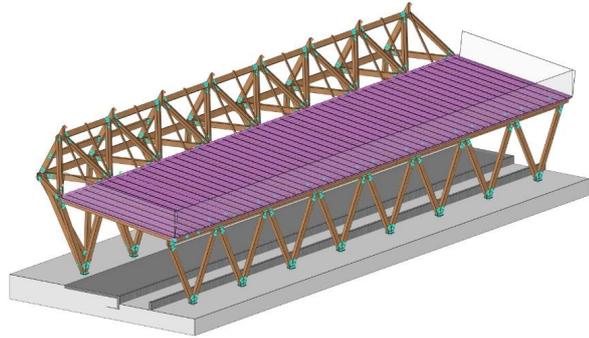

Dépose des bacs à joints debout et de l'ensemble des pattes de fixations associées

Quantité : 124m<sup>2</sup>  
A 2 personnes

Perspective

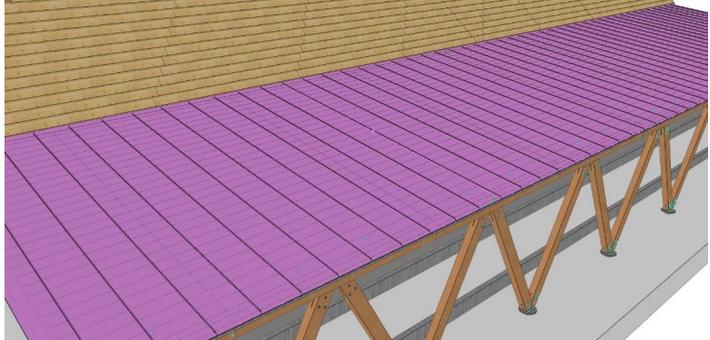

Dépose des profils en rives et en égouts et de l'ensemble des pattes de fixations associées

Quantité : 3  
A 1 personne

Perspective



Dépose des planches de relevé

Quantité : 8  
A 1 personne

Perspective



Dépose des lattages support de relevé et de bardage haut  
Vissé sur structure haute des tripodes


Quantité : 31  
A 2 personnes



6


**Dépose partie haute tripodes**

Dépose de la partie haute de la structure  
des tripodes  
Stockage des bois sur chantiers

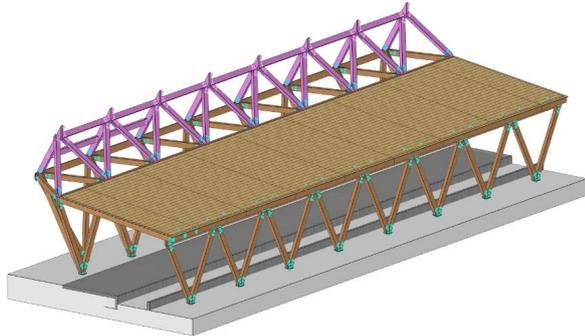


Dépose des supports d'enseignes  
Boulonnés sur ferrures en âmes sur  
arbalétriers

Quantité : 2  
A 2 personnes

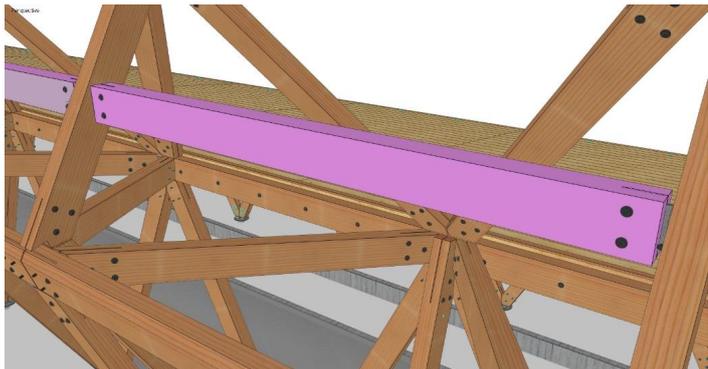

Dépose des ferrures des supports  
d'enseignes  
Boulonnés sur arbalétriers

Quantité : 4  
A 2 personnes

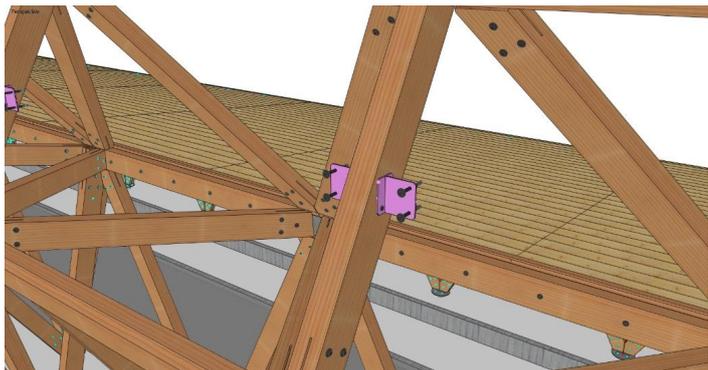


Dépose des pannes faitières  
Boulonnés sur arbalétriers

Quantité : 7  
A 2 personnes




Dépose des liens supérieurs deux par deux à l'avancement  
Boulonnés sur ferrures en âme sur arbalétriers

Quantité : 2  
A 2 personnes

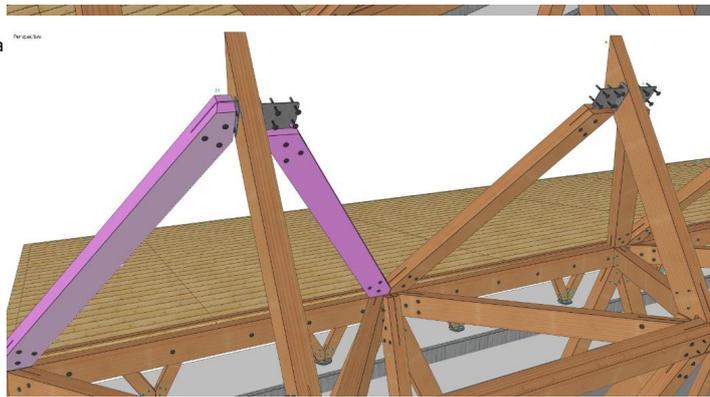


Dépose des arbalétriers à l'avancement  
Boulonnés en pied sur ferrure en âme

Quantité : 1  
A 2 personnes

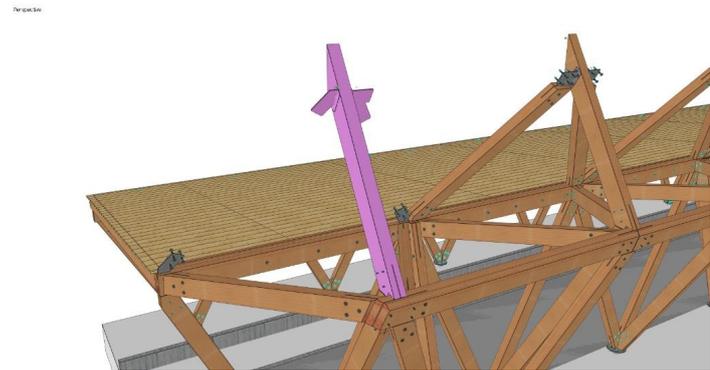

Répéter les 2 dernières opérations 6 fois


Quantité : 6  
A 2 personnes

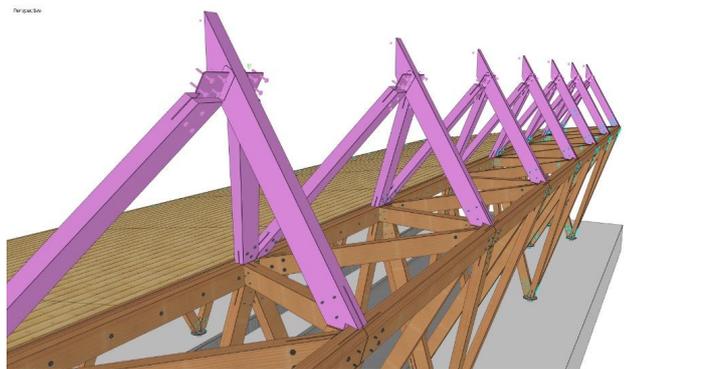

7

#### **Etayage des bipodes**

Etayage des bipodes jusqu'à leur dépose  
Pour maintien pendant levage des caissons de toiture

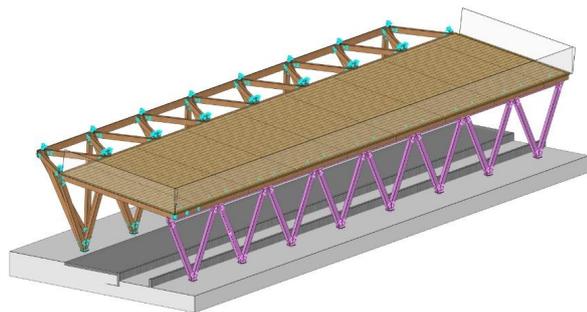


8

#### **Dépose des caissons de toiture**


Dépose des caissons de toiture assemblés

Stockage des caissons en 1 pile et rablettes entre chaque caissons  
Suppression à l'avancement de la sécurité collective en toiture

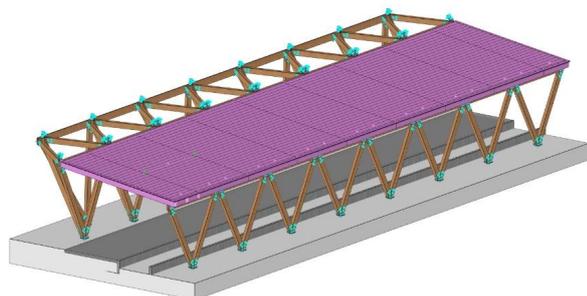


Dépose caisson par caisson  
Boulonné en pied sur les bipodes  
Déboulonnage une fois l'élément élingué

Quantité : 8  
A 2 personnes + grue

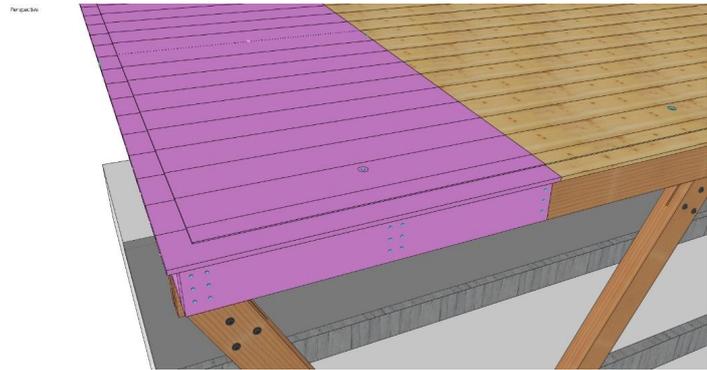

Dépose caisson par caisson  
Boulonné en rive depuis le demi chevron et  
en tête contre le tripode  
Déboulonnage une fois l'élément élingué


Quantité : 8  
A 2 personnes + grue

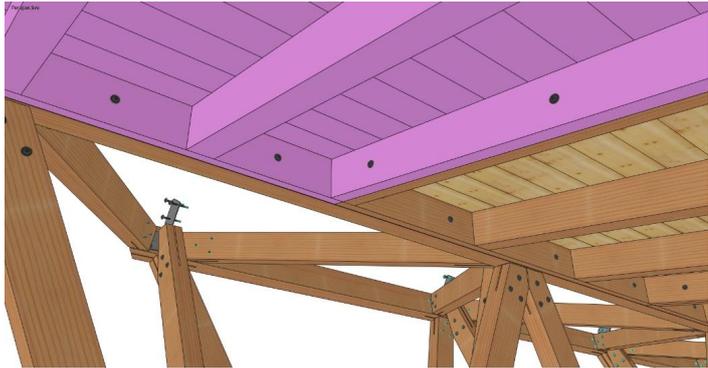

9


#### Dépose des bipodes

Dépose des bipodes et ferrures en âme  
associées  
Stockage des bois sur chantiers  
Suppression des étais à l'avancement

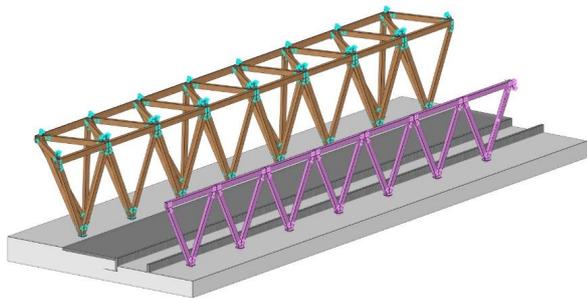


Dépose des pannes des bipodes  
Boulonné sur ferrures en âmes

Quantité : 8  
A 2 personnes

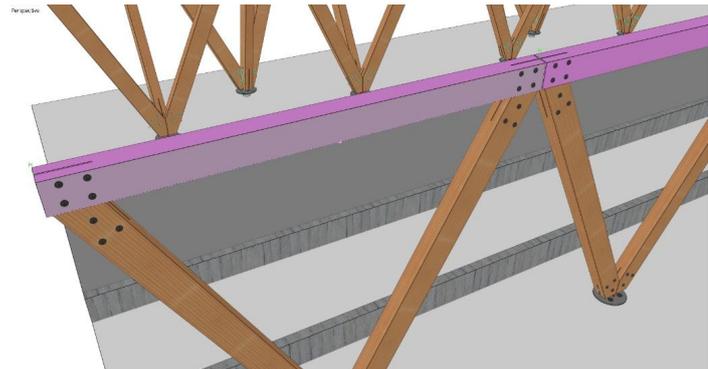


Dépose des poteaux des bipodes  
Boulonnés sur ferrures en âmes  
Compris démontage des ferrures en âme  
Suppression des étais à l'avancement

Quantité : 16  
A 2 personnes

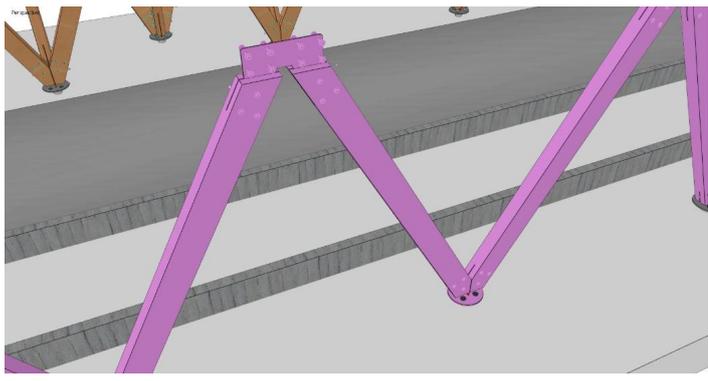

Dépose des ferrures de pieds des bipodes


Quantité : 8  
A 2 personnes

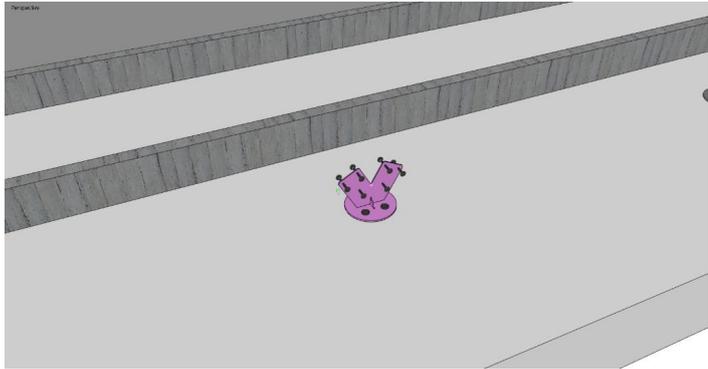

10


**Dépose des tripodes**

Déboulonnage et dépose des tripodes et ferrures en âme associées  
Stockage des bois sur chantiers

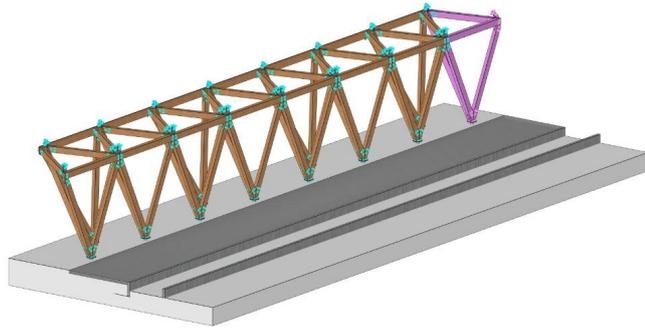


Etayage préalable des tripodes inclinés et des tripodes verticaux

Quantité : 12  
A 2 personnes

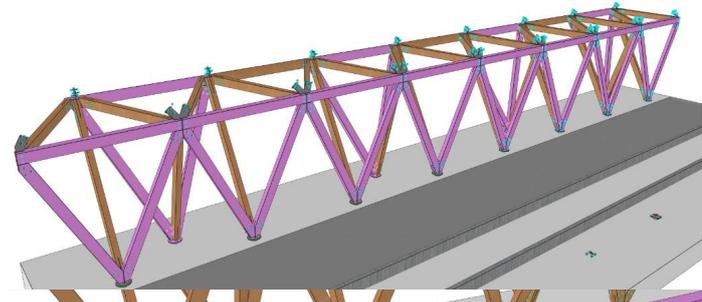


Dépose des pannes intermédiaires  
Bouloignées sur ferrures en âme tripodes arrières

Quantité : 3  
A 2 personnes

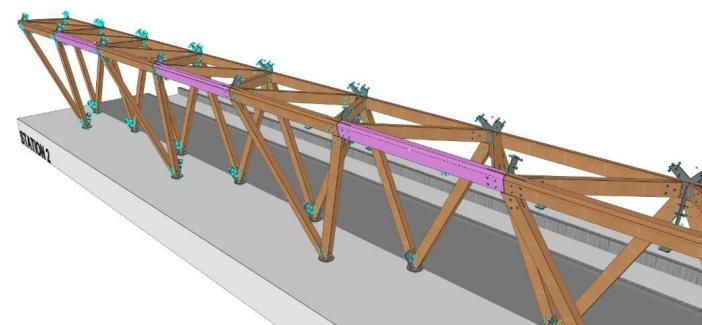

Dépose des liens transversaux  
Bouloignées en tête et en pied sur ferrures en âme contre tripodes verticaux et tripodes arrières

Quantité : 3  
A 2 personnes

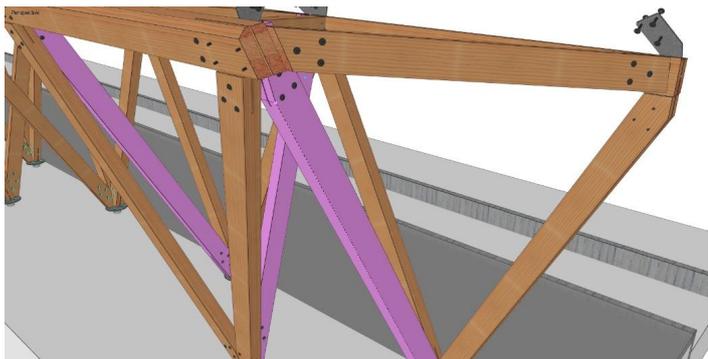

Dépose des liens  
Bouloonnés sur ferrures en âme contre  
tripodes verticaux et tripodes arrières

Quantité : 4  
A 2 personnes



Dépose des tripodes arrières  
Bouloonnés sur ferrures en âmes  
Compris démontage des ferrures en âme  
Suppression des étais à l'avancement

Quantité : 3  
A 2 personnes




Dépose des tripodes verticaux  
Bouloonnés sur ferrures en âmes  
Compris démontage des ferrures en âme  
Suppression des étais à l'avancement

Quantité : 4  
A 2 personnes




Répéter les 4 dernières opérations pour les  
3 derniers ensembles de tripodes

Quantité : 3  
A 2 personnes

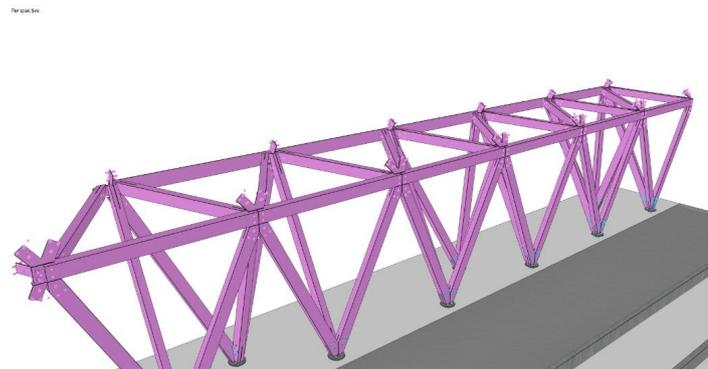

Dépose des ferrures de pieds des tripodes

Quantité : 12  
A 2 personnes

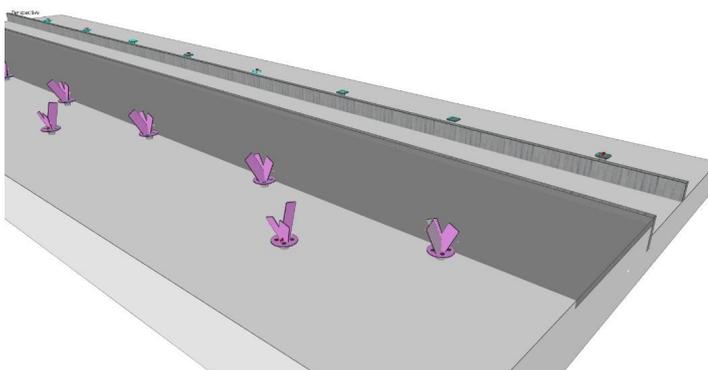

11

**Dépose des technopieux**  
Dévissage et enlèvement des systèmes de  
fondation Technopieu

