




GRUPE SCOLAIRE DE VERDUN SUR GARONNE


MATRE D'OUVRAGE	MOA	MAIRIE DE VERDUN PLACE DE LA MAIRIE - 82600 VERDUN	Tel : 05 63 02 50 36 Fax : 05 63 64 38 43
ARCHITECTES MANDATAIRES	ART	ARTUR ARCHITECTES 80 OUALDES CHARTRONS - 33300 BORDEAUX bordeaux@artur.archi	Tel : 05 56 90 75 30 Fax: 05 56 90 75 39
ARCHITECTES CO-TRAITANT	ARK	AGENCE ARKHIDEE 95 RUE DE LA BASTIDE - 82600 VERDUN SUR GARONNE emiliewalthe@arkoo.fr	Tel : 09 51 71 06 36
BUREAU DETUDE TECHNIQUE STRUCTURE BOIS	B3B	BET3B SARL 10 PLACE NATIONALE - 82000 MONTAUBAN bet@bet3b.fr	Tel : 05 63 66 51 93
BUREAU DETUDE TECHNIQUE STRUCTURE BETON	CEI	BET CEI LE GUA - LA PANDARIE - 12110 AUBIN jerome-higuiez@orange.fr	Tel : 09 63 58 75 46
BUREAU DETUDE TECHNIQUE FLUIDES-THERMIQUES-SSI-CUISINE	BRE	BET BREHAULT 1 RUE PAUL BERT - 46100 FIGEAC brehautl@wanadoo.fr	Tel : 05 65 34 22 44
ACOUSTICIEN	VH	CABINET VINCENT HEDONT 72 RUE DE LEYBARDE - 33000 BORDEAUX vincent@hedont.fr	Tel : 06 56 80 02 76
PAYSAGISTE	TH	AGENCE TROUILLOT/HERMEL 6 RUE RENÉ MARTRENGHAR - 33150 CENON trouillat.hermel@orange.fr	Tel : 05 56 86 77 31
BUREAU DE CONTROLE	BC	BUREAU ALPES CONTROLE 31 AVENUE JEAN JAURES - 82000 MONTAUBAN montauban@alpes-contrôle.fr	Tel : 05 82 73 00 02
ORDONNANCEMENT PILOTAGE COORDINATION	OPC	IB2M OPC LE CLOS DE GAGES - 725 ROUTE DE BOURGAUSE - 12630 GAGES contact@ib2m.fr	Tel : 05 65 42 03 41
COORDINATION SPS	SPS	ELYFEC BATIMENT SUD AMERICA-20 BOULEVARD THIBAUD - 31100 TOULOUSE jrn.dominiques@elyfec-sps.fr	Tel : 06 76 48 46 33

PLANS DE PHASAGE

OPERATION	CODE EMETTEUR	N° DOC	TYPE	ECHELLE	INDICE	DOSSIER DE CONSULTATION
VER	ART	200	PLANS		A	

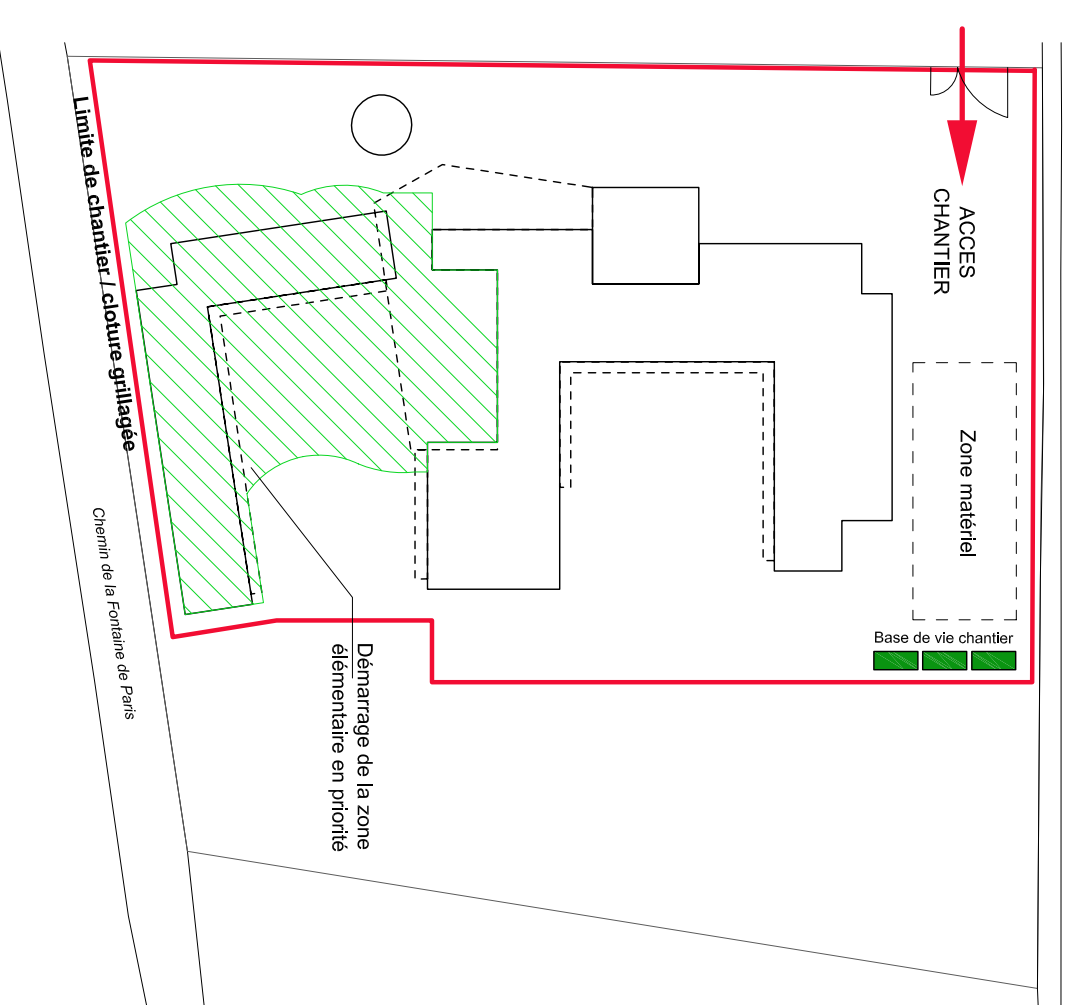


PHASE 1 - Avril 2016 / Août 2016
Réception phase 1 : fin Août 2016
Réalisation des 7 classes élémentaires et de leurs sas d'accès
Avancement pour les lots 03 et 04 des phases suivantes

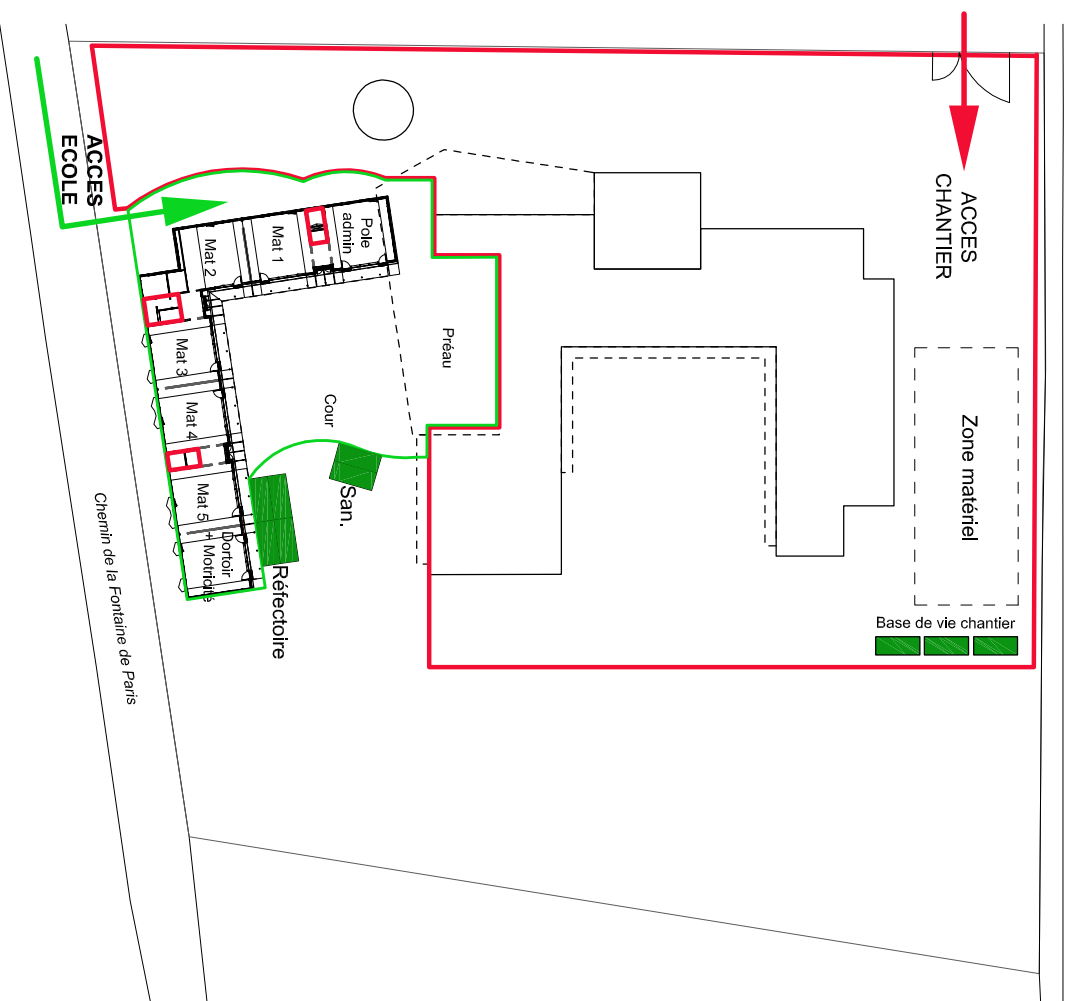

PHASE 2 - Septembre 2016 / Février 2017 (avant les vacances d'hiver)
 Installation des Maternelles dans les futures classes élémentaires pour la rentrée septembre 2016
 Réalisation des bâtiments Administration, Motricité et Restauration
 Avancement chantier école Maternelle

PHASE 2b
 Septembre 2016 / Novembre 2016
 Réalisation des locaux techniques et sanitaires entre classes maternelles installées dans la future école élémentaire

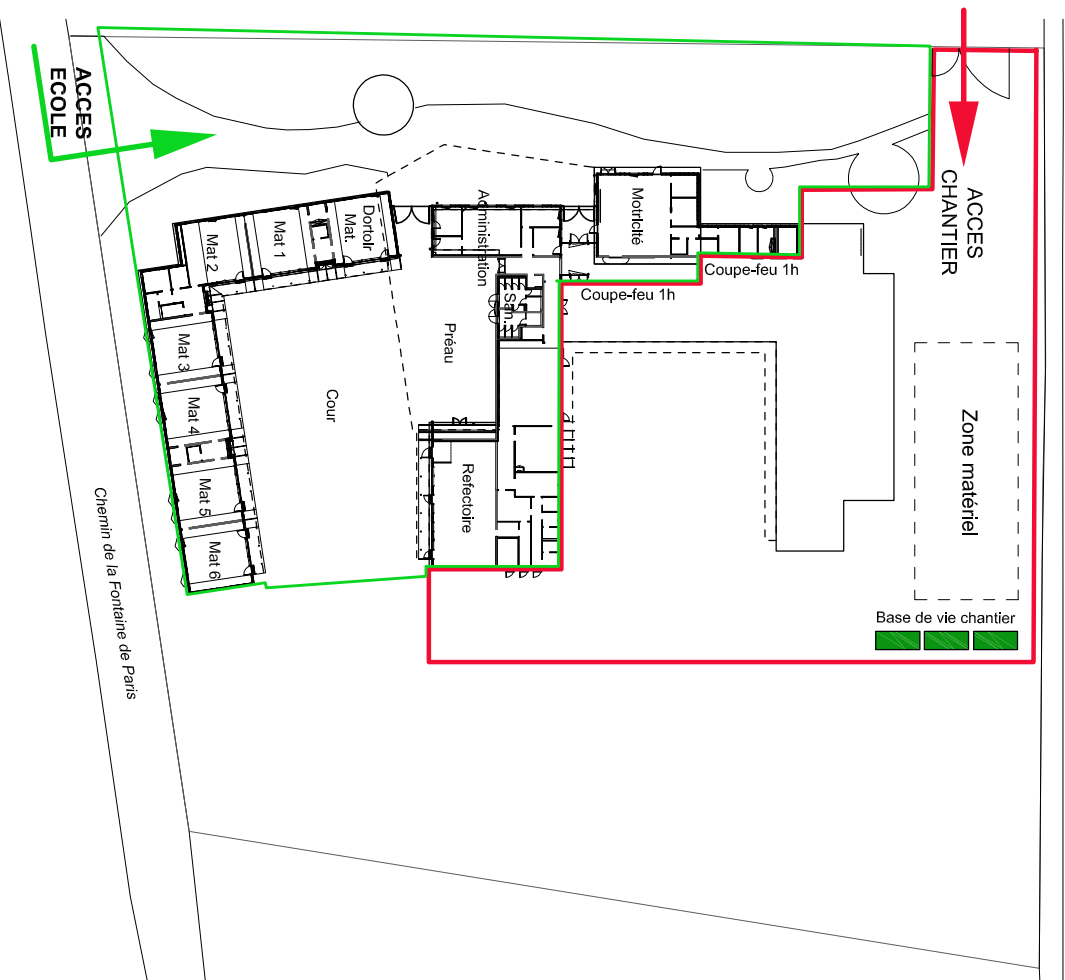

PHASE 3 - Février 2017 / Août 2017
 Livraison de l'espace public
 Livraison des bâtiments Administration, Motricité et restauration
 Finition Ecole Maternelle et parking



LIVRAISON BATIMENT - Août 2017
