

Mesure de perméabilité à l'air

Rapport d'essai



Ecole Périgny

rue du stade

17180	Périgny
Dossier n°	201903-015
Date des mesures	30/09/2019, 23/10/2019
Q4Pa-surf atteint en $\text{m}^3/(\text{h} \cdot \text{m}^2)$:	0,39
Q4Pa-surf visé en $\text{m}^3/(\text{h} \cdot \text{m}^2)$	0,80

Objectif atteint

1 RAPPORT DE SYNTHÈSE

4 zones ont été mesurées sur un total de 5 zones.

1.1 Objet de l'essai


Q4Pa-surf visé en $m^3/(h.m^2)$ 0,80

zones	Q4Pa-Surf	Ai
Zone classes 1	0,35 $m^3/(h.m^2)$	329,62
Zone classe 2	0,39 $m^3/(h.m^2)$	310,41
Zone restauration-Batiment Nord 2	$m^3/(h.m^2)$	450,96
Zone classe 3	0,43 $m^3/(h.m^2)$	329,62

1.2 Résultat global

Q4Pa-surf visé en $m^3/(h.m^2)$ 0,80

Q4Pa-surf atteint en $m^3/(h.m^2)$ 0,39

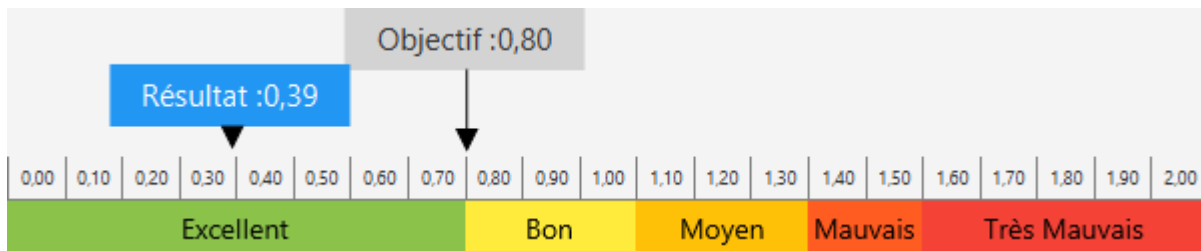

	Maison individuelle	Habitat collectif	Bâtiment tertiaire
Référence RT2005	0,8	1,2	1,2 ou 2,5
Valeur par défaut RT2005	1,3	1,7	1,7 ou 3
RT2015 BBC Effinergie neuf et RT2012	0,6	1,0	-
Effinergie+	0,4	0,8	-

1.3 Commentaires généraux

2 RAPPORT D'ECHANTILLONNAGE

2.1 Liste des Zones

	Nom	Sh(m ²)	Sélectionné pour l'échantillonnage
	Zone classes 1	189.4	Oui
	Zone classe 2	189.4	Oui
	Zone classe 3	189.4	Oui
